

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ ӨРГӨТГӨН УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗҮҮН БҮСИЙН ДУЛААНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ” БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ


2023 оны 11 дүгээр сарын 2-оос 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хооронд хийсэн ажлын тайлан

№	Ажлын нэр	Тайлбар
1	Төслийн явц	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 8-ны хооронд үнсний силосын Г-А/8-14 тэнхлэгийн 9.7м дам нурууны хавтангийн арматур, хэв хашмалыг угсарч, М400 маркын бетоноор нийт 270м³ талбайд бетон цуглах ажил хийгдэж дууссан. 2. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 8-ны хооронд үнисний силосын Р-Н/1-14 тэнхлэгийн 5.5м-ээс доошхи карказан их биеийг буулгах ажил дууссан. 3. 11-р сарын 2-ны өдөр үндсэн цехийн барилгын ±0.000 өндөржилтийн ажил буюу суурийн ажил 50% хувь нь хийгдэж дууссан. 4. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 8-ны хооронд нүүрсний агуулахын өрлөгийн ажил 50%, суурь давхаргын ажил дууссан. 5. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 6-ны хооронд гаралтын коллекторын сарниах хоолойг суурилуулж гагнасан. 6. 11-р сарын 3-аас 11-р сарын 8-ны хооронд барабаны зайлуулах хоолойг суурилуулан гагнасан. 7. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 8-ны хооронд халуун усны гаралтын коллекторын сарниах хоолойг суурилуулан гагнасан. 8. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 5-ны хооронд нүүрсний агуулахын дээврийн дам нуруу болон хэвтээ тулгуурыг угсарч, пурлин суурилуулсан. Үндсэн бүтээцийг угсарч дууссан. 9. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 8-ны хооронд зуухны зүүн талын дулааны сүлжээний хоолойг угсарсан. 0м давхаргын зуухны өгөх усны хоолойг угсарсан. 10. 11-р сарын 4-өөс 11-р сарын 6-ны хооронд зуухны шатаагчийг суурилуулан, шаарга конвейерыг угсарсан. 11. 11-р сарын 3-аас 11-р сарын 8-ны хооронд үндсэн цехийн барилгын 8м давхрын төмөр дам нурууг угсарч, шалны хавтанг угсарч дууссан. 12. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 8-ны хооронд үндсэн цехийн барилгын А тэнхлэгийн сэндвич ханын хавтанг угсарсан. 13. 11-р сарын 2-оос 11-р сарын 7-ны хооронд уутат шүүлтүүрийн доод дам нурууг угсарч, үнсний бункерийг байрлуулан суурилуулсан. 14. 11-р сарын 3-аас 11-р сарын 7-ны хооронд үндсэн цехийн барилгын 25м давхарын каналыг угсарч, агаарын компрессор, сүлжээний усны насос, анхдагч болон хоёрдогч салхилуурын өндөр хүчдэлийн кабель татах ажил дууссан. 15. 11-р сарын 5-аас 11-р сарын 8-ны хооронд тусгаарлагчийн дотор хэсгийн ажлын шатыг угсарч дуусгасан. 16. 11-р сарын 5-аас 11-р сарын 8-ны хооронд сэнсний гарах яндангийн ажлын шатыг угсарч, дулаалгын хамгаалах төмрийг гагнасан.
2	Зураг төсөл боловсруулалт, магадлал	Бүх зураг хийгдэж дууссан.
3	Төслийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлт, захиалга	<p>Төслийн гол тоног төхөөрөмжүүдийн захиалга үндсэндээ хийгдэж дууссан. Тоног төхөөрөмжийн ерөнхий үйлдвэрлэлт нь дараах байдалтай байна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зуух. Үйлдвэрлэлтийн 100%, нийлүүлэлтийн 95% хийгдэж дууссан. 2. Уутат шүүлтүүр. Үйлдвэрлэлт ба нийлүүлэлт 100% хийгдсэн. 3. Агаарын компрессорын тоног төхөөрөмж, хими усны цехийн тоног төхөөрөмж. Бүгд талбайд ирсэн. 4. Үндсэн цехийн барилгын карказ. Үйлдвэрлэлт болон нийлүүлэлт 100% дууссан. 5. Үнсний силосын их бие: Үйлдвэрлэлт дууссан, нийлүүлэлтийн 60% хийгдсэн. 6. Өндөр, нам хүчдэлийн шүүгээ болон таслуур. Таслуурын шүүгээ талбайд ирсэн, өндөр хүчдэлийн шүүгээ тээвэрлэлтэд гаргасан.


		<p>7. Канал болон кабель талбайд ирсэн. 8. Цонх болон хаалганы сонгон шалгаруулалт дууссан. 9. DCS болон реле хамгаалалтын сонгон шалгаруулалт дууссан. 10. Зуухны өрлөгийн материалын 80% нь талбайд ирсэн. 11. Энэ долоо хоногт сэндвич ханын хавтан 3 машин, зуухны өрлөгийн материал 8 машин, үнсний силосын их биеийн материал 5 машин, кабель 1 машин ирсэн.</p>				
4	Ирэх 7 хоногт хийхээр төлөвлөж буй ажлууд	№	Ажлын нэр	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Тайлбар
		1	Үндсэн цехийн барилгын шал болон 8м давхарын шалны цутгалт дуусна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 14 өдөр	
		2	Үнсний силосын 1-14 тэнхлэг/Р-Н тэнхлэгийн хэв хашмалыг буулгаж дуусна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	
		3	Үнсний силосын 1-7 тэнхлэг/Г-А тэнхлэгийн 5.5м-ээс доошхи хэв хашмалыг буулгах ажил дуусна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	
		4	Нүүрсний агуулахын өрлөгийн ажил болон шалны цутгалтын ажил дуусна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	
		5	Зуухны баруун талын төмөр дам нуруу болон тавцанг угсарна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	Бүгд дуусна
		6	Зуухны их биеийн дотор хэсгийн ажлын шатыг угсарна.	11 сарын 10 өдөр	11 сарын 13 өдөр	
		7	Дээд хэсгийн экономайзерыг суурилуулна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	60% дуусна
		8	Үндсэн цехийн барилгын С тэнхлэгийн пурлиныг суурилуулна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	Бүгд дуусна
		9	Үндсэн цехийн барилгын 18 тэнхлэгийн багана, хөндлөн дам нурааг угсарна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	90% дуусна
		10	Үндсэн цехийн барилгын А тэнхлэг, С тэнхлэгийн сэндвич ханын хавтанг угсарна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	80% дуусна
		11	Зуухны коллекторын холболтын хоолой, зайлуулах хоолойг угсарна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	70% дуусна
		12	Уутат шүүлтүүрийн бүрхүүлийг угсарна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	
		13	Үндсэн цехийн барилгын дулааны сүлжээний хоолойг угсарна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	80% дуусна
14	Үндсэн цехийн барилгын дулааны хоолойг угсарна.	11 сарын 6 өдөр	11 сарын 8 өдөр	60% дуусна		

		15	Гэгсгэх барилгын дулааны хоолойг угсарна.	11 сарын 2 өдөр	11 сарын 8 өдөр	40% дуусна
		16	Үндсэн цехийн барилгын кабель татаж, цахилгааны шүүгээг суурьлуулна.	11 сарын 9 өдөр	11 сарын 15 өдөр	50% дуусна
		17	Хими ус цехийн системийн туршилт хийнэ.	11 сарын 13 өдөр	11 сарын 15 өдөр	
5	Тулгараад буй асуудал болон санал хүсэлт					

Барилгын ажлын зураг

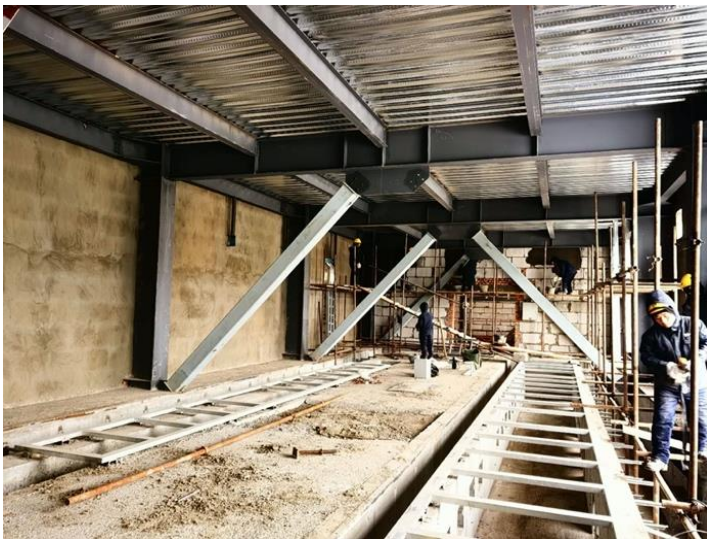

Цахилгаан түгээх өрөөний доторх ханын

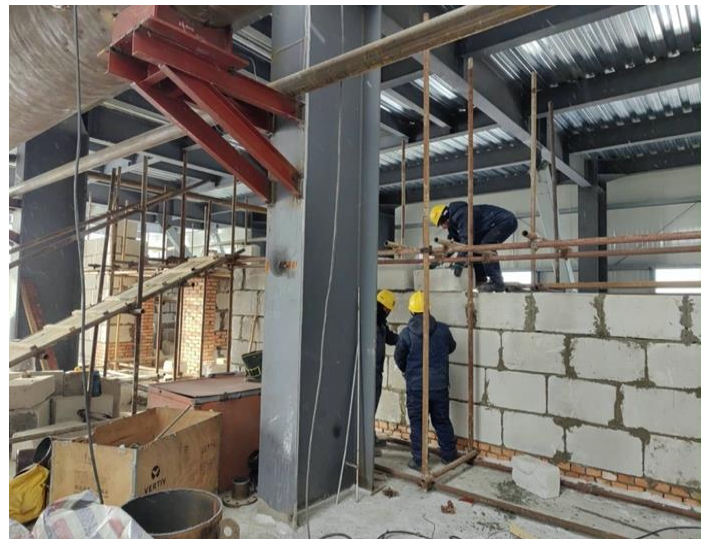


8м давхрын тоосгон ханын өрлөг шавардлага




Үндсэн барилгын А тэнхлэгийн сэндвич ханын хавтан угсралт



Үнсний силосын суурийн ажил

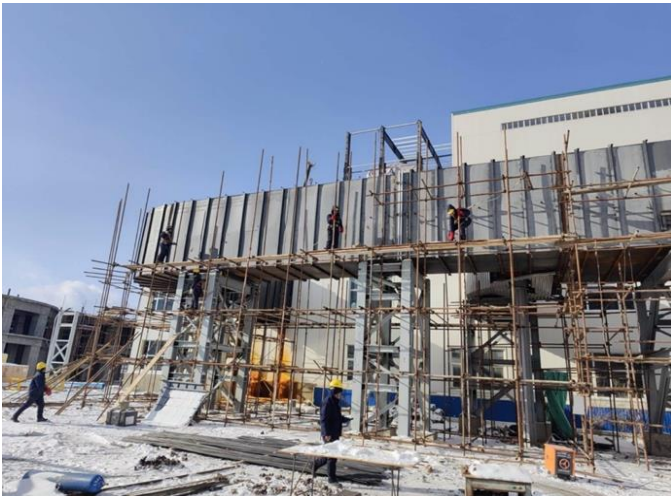

Сэнний гаралтын яндангийн ажлын шат угсралт

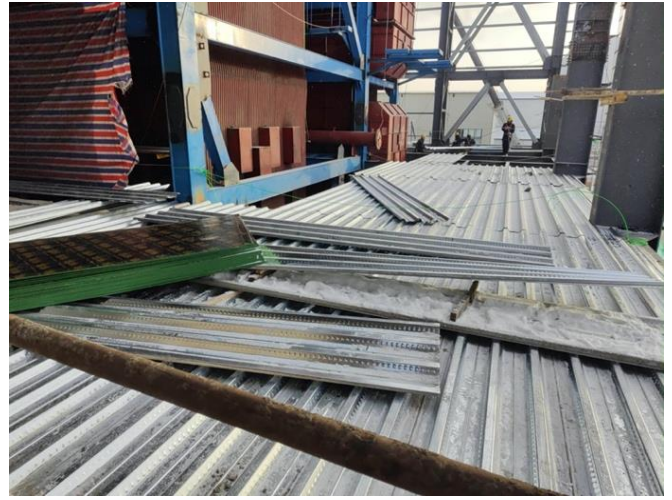

8м давхрын шалны хавтан угсралт




Зуухны өгөх усны хоолойн угсралт



Тусгаарлагчийн дээд хэсгийн холболтын хоолойн угсралт



Шатаагч угсралт

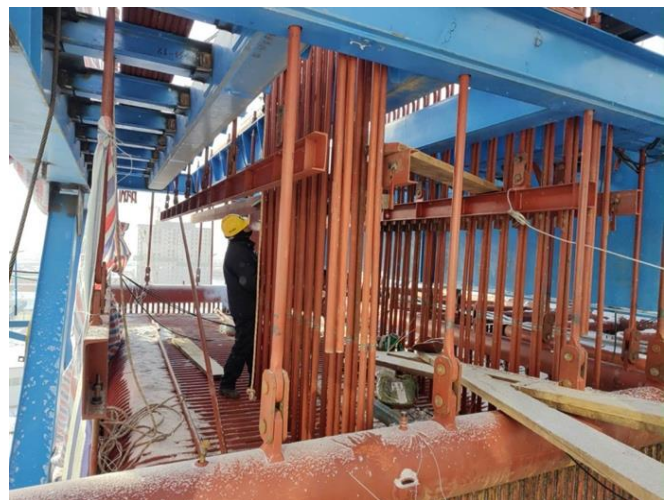

Халуун усны гаралтын коллекторын хоолой угсралт



Зайлуулах хоолой угсралт



Гэсгээх барилгын дулааны хоолойн угсралт



Уутат шүүлтүүрийн үнсний бункер суурилуулалт



18 тэнхлэгийн багана болон хөндлөн дам нурууны угсралт
